



SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

RFC: CATS931108IT6 ABASOLO No. 61 CENTRO, TECALITLAN 49900 TECALITLAN JALISCO México

I - Ingreso Versión 3.3 Factura Serie y Folio: 4
FECHA: 5/12/2018 11:37:41
Folio Fiscal: 9433393A-35BE-403C-AFA6-3883F0007373 Fecha y hora de certificación: Diciembre 5 2018 - 11:50:41 Serie del Certificado del emisor: 00001000000412505599 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
CONDICIONES:
USO CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN: CP: 49900	CLIENTE: 01 MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO	R.F.C.: MZG8501012NA
	DOMICILIO: Av. Colon No. 62, COLONIA: Centro, POBLACION: Ciudad Guzmán, Jalisco, C.P.: 49000	
	FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos, MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición, MONEDA: MXN - Peso Mexicano	
Observaciones:	Referencia:	

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	01 SAT: 30191800	RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO LA CANTIDAD DE \$ 25,350.78 (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS .78/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONTRUCCION DEL DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DUNANT UBICADA EN LA CALLE INTENCIONAL No. 15 EN LA COLONIA CRUZ ROJA EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO CON NUMERO DE CONTRATO DOP/FFIB/2018-09/020 CON FIANZA DE ANTICIPO # 3502-12217-3 Y FINZA DE CUMPLIMIENTO # 3502-12218-2 ASERTA AFINZADORA S.A. DE C.V. DEDUCCIONES 5 AL MILLAR \$ 1,293.10 2 AL MILLAR \$ 517.24 NETO A PAGAR \$ 23,540.44 (VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS .44/100 M.N.)	21,854.12	002 - IVA - 3,496.66	21,854.12

IMPORTE CON LETRA
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 78/100 M.N.
Este documento es una representación impresa de un CFDI
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL:	21,854.12
ImpuestosTrasladados	
I.V.A. 16%:	3,496.66
TOTAL:	25,350.78



Sello digital del CFDI

dHMeChc0obyRHPXFTJYneFFQIBTYrM23qDNVnacleXP3KbHyaSujrH09yn2IRHfgkVSMKkU6pwpHPieI73eA
hTOLY2EqBISAN9wPRoabfo8B+R3CaY5I3220ppWMBQq4Q1FOFsqI8wKbeeJHOXxSyoSqa3GJAgVos412Nh
ADSpHyK5zTGksCujNcilUJ8Y049ywM/KblNypfxoSf6U1o0a8X0d8EOyaAuNNEJIXITmTYuyiQLoygIF3/+QDM9E6WKEeuU86NCNAGcD8lmlV4SCda+N4Y4YA+ebSnU+V+nS1G/kqmrAnb8FZ4bxALT3IKmk93JO1mQ==

Sello del SAT

htC6mXtYmEc34q/wl1JuDBHrSFks0b2776ynAZActaUUV1V3n1C0IVAcci48dVY7Z7HIAzQnOWESK
Z3vCLC6tmUCMPzQnP+ObvivaWGL0ho01F11f+zVyEpDD5Zl53BnVsvPiSWwzK+Ezr+56HzvdXo+HXqo
S0Cry3nslLWswWEK8y6oadNR17jyTslQqHu7o4B2MCCdTJqXD0v5PKQaG4KT9h3o9c5S5eHqR0Oom
a3cZfxcXIYC7JvNeBF9nPubCplSyXl33BZadHqiwHekRcWtqu77wwAdRvC/plwISYvcjHAIxcBgy
ZrI57WEVtiJolIRIE8X7mA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9433393A-35BE-403C-AFA6-3883F0007373|2018-12-05T11:50:41|MAS0810247C0|dHMeChc0obyRHPXFTJYneFFQIBTYrM23qDNVnacleXP3KbHyaSujrH09yn2IRHfgkVSMKkU6pwpHPieI73eA
hTOLY2EqBISAN9wPRoabfo8B+R3CaY5I3220ppWMBQq4Q1FOFsqI8wKbeeJHOXxSyoSqa3GJAgVos412Nh
ADSpHyK5zTGksCujNcilUJ8Y049ywM/KblNypfxoSf6U1o0a8X0d8EOyaAuNNEJIXITmTYuyiQLoygIF3/+QDM9E6WKEeuU86NCNAGcD8lmlV4SCda+N4Y4YA+ebSnU+V+nS1G/kqmrAnb8FZ4bxALT3IKmk93JO1mQ==|00001000000404486074||



Banco:
Debe(mos) y pagare(mos) incondicionalmente por este Pagaré a la orden de SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO en TECALITLAN, JALISCO el día la cantidad de: \$25,350.78 (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 78/100 M.N.), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no ser pagado a su vencimiento causara intereses moratorios del 5% mensual, todo cheque devuelto causara un 20% sobre el valor del mismo según artículo 7 y 39 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO Firma de Aceptación

DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLA SENA DIRECCION CON SERVICIOS
1.1 DIC 2018
1330
RECIBIDO

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Folio="4"
  Fecha="2018-12-05T11:37:41"
  Sello="dHMcHc0obyRhIPXFTJYneFFQtBTyrM23qDNVnacleXP3KbHyaSujrH09yn2tRHfgktVSMKkU6pwHpPiei73eAht0LY2EqjBtSAN9wPRoabfo
  FormaPago="03" NoCertificado="00001000000412505599"
  Certificado="MIIGOTCCBCGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTI1MDU1OTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIG
  SubTotal="21854.12" Moneda="MXN" Total="25350.78" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="49900">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="CATS931108IT6" Nombre="SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO" />
  <cfdi:Receptor Rfc="MZG8501012NA" Nombre="MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO" UsoCFDI="G03" />
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ClaveProdServ="30191800" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="01"
  Descripcion="RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO LA CANTIDAD DE $ 25,350.78
  (VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS .78/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No 1 DE LA OBRA
  DENOMINADA CONTRUCCION DEL DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DUNANT UBICADA EN LA CALLE INTENACIONAL No. 15
  EN LA COLONIA CRUZ ROJA EN CIUDAD GUZMAN MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO CON NUMERO DE CONTRATO
  DOP/FFIB/2018-09/020 CON FIANZA DE ANTICIPO # 3502-12217-3 Y FINZA DE CUMPLIMIENTO # 3502-12218-2 ASERTA
  AFINZADORA S.A. DE C.V. DEDUCCIONES 5 AL MILLAR $ 1,293.10 2 AL MILLAR $ 517.24 NETO A PAGAR $ 23,540.44
  (VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS .44/100 M.N.) ValorUnitario="21854.12" Importe="21854.12">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Base="21854.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3496.66" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3496.66">
- <cfdi:Traslados>
  <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="3496.66" />
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  Version="1.1" UUID="9433393A-35BE-403C-AFA6-3883F0007373" FechaTimbrado="2018-12-05T11:50:41"
  RfcProvCertif="MAS0810247C0"
  SelloCFD="dHMcHc0obyRhIPXFTJYneFFQtBTyrM23qDNVnacleXP3KbHyaSujrH09yn2tRHfgktVSMKkU6pwHpPiei73eAht0LY2EqjBtSAN9wP
  NoCertificadoSAT="00001000000404486074"
  SelloSAT="htC6m/xTYmEc34q/wI1jUuDBHrSFks0b2776ynAzActacIUV1V3n1C0IvAcci48dVY7Z7HIAzQnOWESKZ3vCLC6tmUCMPzQnP+Obv
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTROL DE OBRA PUBLICA

FECHA: 03/12/2018

Contrato: DOP/FFIB/2018-09-020

Recurso: "FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN 2018 Convenio B", aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018,

Contratista: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

Obra: CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT

Localidad: CIUDAD GUZMAN, JALISCO.

Municipio: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

Fecha de Inicio: 07 DE OCTUBRE

Fecha de Término: 15 DE DICIEMBRE

Estimación No.: 1 (UNO)

Periodo:

07/10/2018

Al:

17/10/2018

Resumen de Documento		
+ Importe de la Estimación	\$29,138.83	\$29,138.83
+ Aditiva	\$0.00	\$0.00
- Deductiva	\$0.00	\$0.00
+ IVA: 16%	\$4,662.21	\$33,801.04
- Amortización	\$8,450.26	\$25,350.78
Total	\$25,350.78	\$25,350.78


Avance	
Fecha Inicial:	07 DE OCTUBRE
Financiero:	33.45%
Físico %	11.27%
Fecha:	03/12/2018

Techo Financiero	Importe	Acumulado	Importe
Presupuesto Base	\$300,000.00	Esta Estimación	\$33,801.04
Convenio Adicional	\$0.00	Acumulado Anterior	\$0.00
Suma Escalatorias	\$0.00	Acumulado Actual	\$33,801.04
Total	\$300,000.00	Saldo	\$266,198.96

Anticipo		
Anticipo	25.00%	\$75,000.00
Amort. Del acumulado		\$0.00
Esta amortización		\$8,450.26
Total Amortizado		\$8,450.26
Saldo por amortizar		\$66,549.74

Detalle	Federal	Estatad	Municipio
Importe	\$21,854.12	\$0.00	\$0.00
Escalatoria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IVA	\$3,496.66	\$0.00	\$0.00
Total a Facturar	\$25,350.78	\$0.00	\$0.00
Deducción del 5 al millar (SFP)	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00
Deducción del 2 al millar (CMIC)	\$517.24	\$0.00	\$0.00
Total a Pagar	\$23,540.44	\$0.00	\$0.00

Sumas	
	\$21,854.12
	\$0.00
	\$3,496.66
	\$25,350.78
	\$1,293.10
	\$517.24
	\$23,540.44

 ARQ. JESUS EUGENIO CAMPOS ESCOBAR DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
EMPRESA	
 ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO REPRESENTANTE LEGAL	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE GESTION DE PROGRAMAS COPLADEMUN Y VINCULACION CON DELEGACIONES

11 DIC 2018 13³⁰

RECIBIDO

CUERPO DE ESTIMACION

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 ESTIMACION DE TRABAJOS


OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT

ESTIMACION: 1 (UNO) **MUNICIPIO:** ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO **DEL:** 07/10/2018 **AL:** 17/10/2018


PERIODO DE TRABAJO

No. DE CONTRATO: DOP/FFIB/2018-09/020 **HOJA:** 1 DE 2


CONCEPTOS	U	CANTIDADES			IMPORTES				
		PRESUP. BASE	ESTIM. ACUM.	ESTA ESTIM.	SALDO	PRESUP. BASE	ESTIM. ACUM.	ESTA ESTIMACION	SALDO
PRELIMINARES									
301-PRE-01-001	M2	214.50	0.00	214.50	0.00	\$1,289.15	\$	1,289.15	\$0.00
TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.									
301-PRE-04-022	M2	8.00	0.00	8.00	0.00	\$189.04	\$	189.04	\$0.00
DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.									
CIMENTACION									
Z1	PZA	8.00	0.00	8.00	0.00	\$25,827.60	\$	25,827.60	\$0.00
ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.235 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 5 VARS. # 4, Y ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE EXCAVACION A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.									
ALBANELERIA									
304-ALB-06-014	M2	8.00	0.00	8.00	0.00	\$1,833.04	\$	1,833.04	\$0.00
REPOSICION DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.									
		Subtotal esta Hoja				\$29,138.83	\$0.00	\$29,138.83	\$0.00
		Total				\$29,138.83	\$0.00	\$29,138.83	\$0.00




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS




DIRECTOR



REPRESENTANTE LEGAL

ING. JOSÉ DAVID DAMIAN RIOS

CUERPO DE ESTIMACION		GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ESTIMACION DE TRABAJOS ORDINARIOS		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		MUNICIPIO: ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO				
ESTIMACION: 1 (UNO)		PERIODO DE TRABAJO		DEL: 07/10/2018 AL: 17/10/2018				
No. de CONTRATO: DOPFFIB/2016-09/020		HOJA: 2 DE 2						
CLAVE	CONCEPTOS	U	CANTIDADES		PRECIO UNITARIO	IMPORTE		SALDO
			PRESUP. BASE	ESTIM. ACUM.		ESTA ESTIM.	ESTIM. ACUM.	
303-EST-02-010	ESTRUCTURA METALICA ESTRUCTURA METALICA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	1,968.932	0.00	74.60	\$146,866.06	\$	\$146,866.06
303-EST-03-001	CUBIERTA DE LONA CUBIERTA DE NAVE, SISTEMA DE LONA BLACKOUT DE 21 ONZAS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, ANCLAJES, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	234.16	0.00	332.81	\$77,929.33	\$	\$77,929.33
305-PVP-05-013	PINTURA PINTURA DE ESMALTE, EN ESTRUCTURA DE METALICA, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	1,968.973	0.00	2.37	\$4,666.47	\$	\$4,666.47
Subtotal esta Hoja			\$229,481.86	\$0.00	\$0.00	\$229,481.86	\$0.00	\$229,481.86
Total			\$268,820.69	\$0.00	\$229,138.33	\$268,820.69	\$229,138.33	\$229,481.86



REPRESENTANTE LEGAL

ING. SIAMIR YOSAM CARDEMAS DEL TORO

ARQ. JESUS EUGEMIO CAMPOS ESCOBAR
DIRECTOR

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS
ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO No. DOP/FIB/2018-09/020		OBSERVACIONES				
OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT		ESTIMACION No. 1 (UNO) HOJA No. 1 DE 4						
UBICACION: CIUDAD GUZMAN, JALISCO.		PERIODO: DEL 07 AL 17 DE OCTUBRE DE 2018						
CONTRATISTA: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO								
NUMEROS GENERADORES DE OBRA								
Nº.	CONCEPTO	REFERENCIA	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	TOTAL	U
301-PRE-01-001	TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1-4, A-B	19.50	11.00			214.50	M2
							214.50	M2
							TOTAL:	



JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

[Handwritten signature in blue ink]

ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

REPRESENTANTE LEGAL


[Handwritten signature in blue ink]

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

<p>GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>CONTRATO No. <u>DOP/FEIB/2018-09/020</u></p>	<p>ESTIMACION No. 1 (UNO) HOJA No. 1 DE 4 PERIODO: DEL 07 AL 17 DE OCTUBRE DE 2018 REALIZO:</p>
<p>OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:</p>	<p>CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT CIUDAD GUZMAN, JALISCO. ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO</p>	<p>TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>
<p>301-PRE-01-001</p>		

CROQUIS

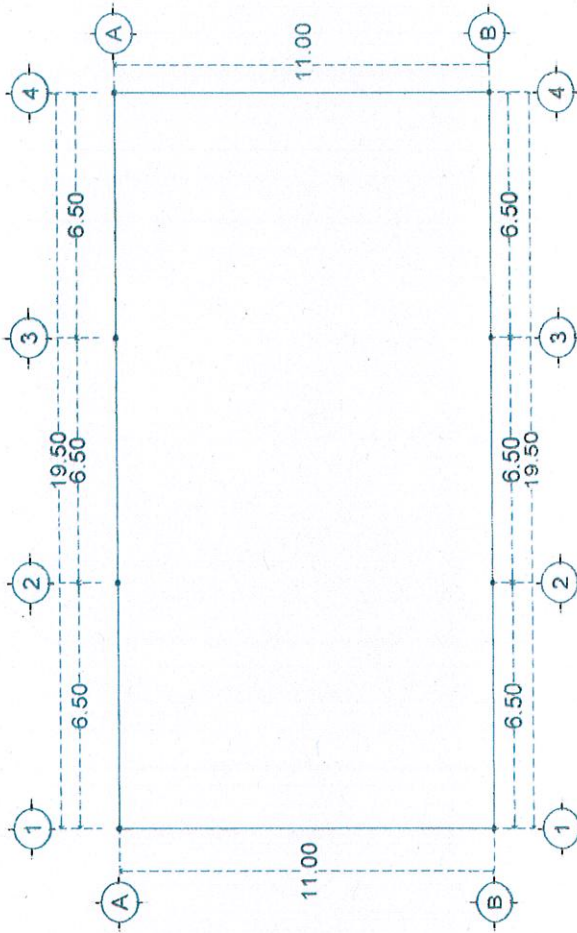

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
[Signature]
ING. JOSE BRAYDAN RIOS

REPRESENTANTE LEGAL
[Signature]
ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO


GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO No. DOP/FRIB/2018-09/020		OBSERVACIONES				
OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:		CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT CIUDAD GUZMAN, JALISCO. ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO		ESTIMACION No. 1 (UNO) HOJA No. 2 DE 4 PERIODO: DEL 07 AL 17 DE OCTUBRE DE 2018				
NUMEROS GENERADORES DE OBRA								
No.	CONCEPTO	REFERENCIA	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	TOTAL	U

301-PRE-04-102	DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	A , '1-4 B , '1-4	1.00 1.00	1.00 1.00		4.00 4.00	4.00 4.00	M2 M2
TOTAL:							8.00	M2


REPRESENTANTE LEGAL



ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO



JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA



ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO No.	DOP/FIB/2018-09/020
	OBRA:	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT CIUDAD GUZMAN, JALISCO.
UBICACION:	ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO	ESTIMACION No. 1 (UNO)
CONTRATISTA:		HOJA No. 2 DE 4
		PERIODO: DEL 07 AL 17 DE OCTUBRE DE 2018
		REALIZO:

CROQUIS

DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

301-PRE-04-102

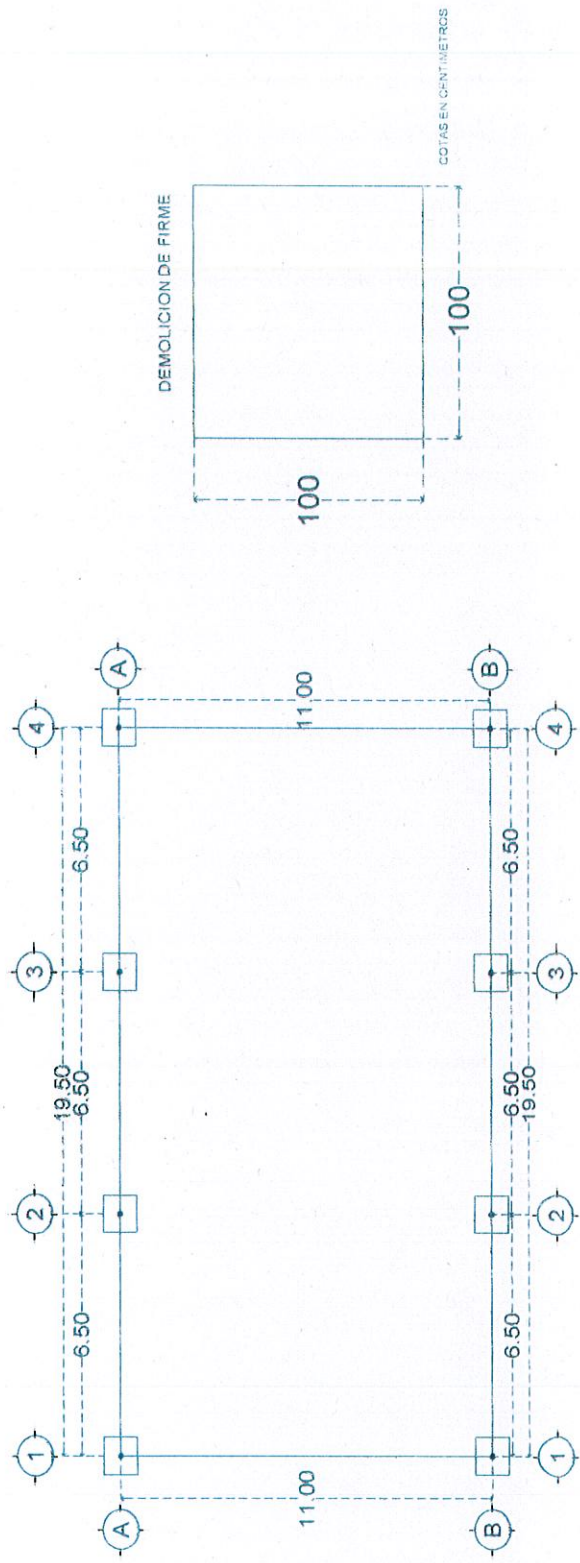

REPRESENTANTE LEGAL
 ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO No. <u>DOP/FFIB/2018-09/020</u>	ESTIMACION No. 1 (UNO)
	OBRA: <u>CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT</u>	HOJA No. <u>2</u> DE <u>4</u>
	UBICACION: <u>CIUDAD GUZMAN, JALISCO.</u>	PERIODO: <u>DEL 07 AL 17 DE OCTUBRE DE 2018</u>
	CONTRATISTA: <u>ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO</u>	REALIZO:

REPORTE FOTOGRAFICO

DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 8 CM., DE ESPESOR A MANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

301-PRE-04-102

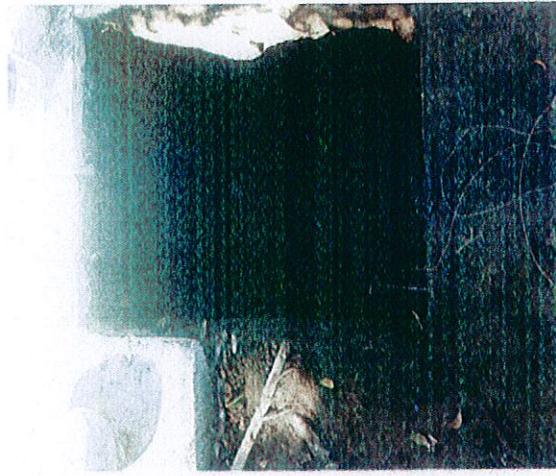

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
 ING. JOSE DAVID DAVIAN RIOS

REPRESENTANTE LEGAL

 ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE		CONTRATO No.		DOP/FFB/2018-09/020		OBSERVACIONES	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		OBRA:		CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT		ESTIMACION No. 1 (UNO)	
UBICACION:		CONTRATISTA:		CUIDAD GUZMAN, JALISCO		HOJA No. 3 DE 4	
				ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO		PERIODO: DEL 07 AL 17 DE OCTUBRE DE 2018	
NUMEROS GENERADORES DE OBRA							
No.	CONCEPTO	REFERENCIA	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	TOTAL
							U

Z21	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.235 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 8 VARS. # 4, Y ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	A , '1-4 B , '1-4	1.00 1.00	1.00 1.00		4.00 4.00	4.00 4.00	PZA PZA
					TOTAL:		8.00	PZA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

 ING. JOSE DAVILA GUZMAN RIOS

REPRESENTANTE LEGAL




 ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO No.	D09/FEB/2018-09/020
	OBRA: UBICACION: CONTRATISTA:	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT CIUDAD GUZMAN, JALISCO. ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
ESTIMACION No. 1 (JUNO)		HOJA No. 3 DE 4
PERIODO: DEL 07 AL 17 DE OCTUBRE DE 2018		REALIZO:

CROQUIS

ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.235 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 8 VARS # 4, Y ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANILLA, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Zz1

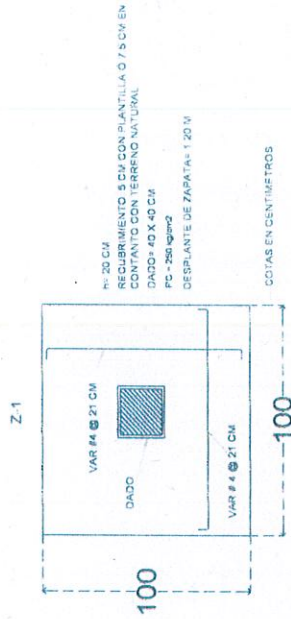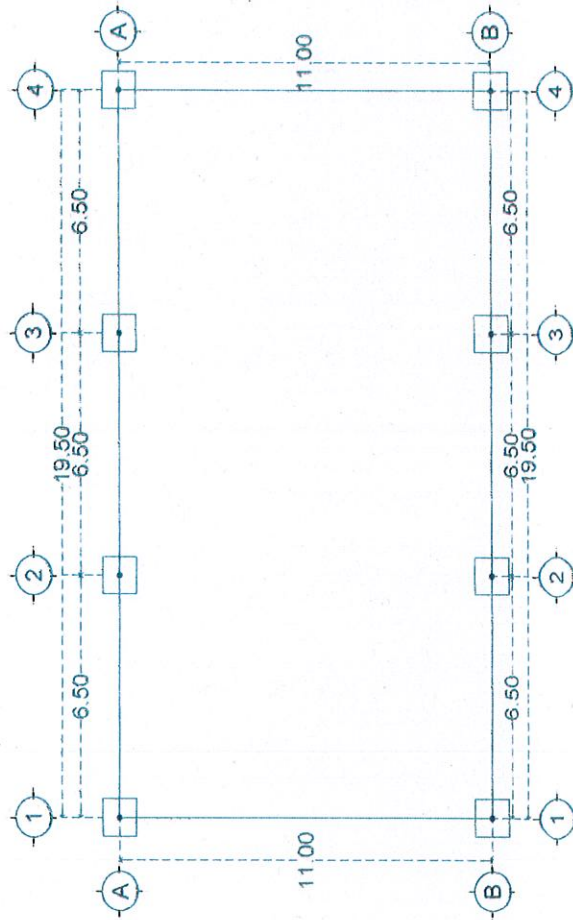

CO-TAS EN CENTIMETROS



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ING. JOSE DAVID DAVIAN RIOS

REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]


ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO


GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO No.	DOP/FEB/2018-09/020
	ESTIMACION No. 1 (UNO)	3 DE 4
HOJA No.	3	DE 4
PERIODO: DEL 07 AL 17 DE OCTUBRE DE 2018	REALIZO:	
CONTRATISTA:	ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO	

REPORTE FOTOGRAFICO

ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.2 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 4 A CADA 0.235 M. EN AMBOS SENTIDOS Y DADO DE 0.4X0.4X1.00 M. DE ALTURA, ARMADO CON 8 VARS # 4, Y ESTRIBOS # 3 @ 0.1 M. INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN TERRENO COMPACTO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, PLANTILLA, CIMBRADO ACABADO COMÚN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Z31

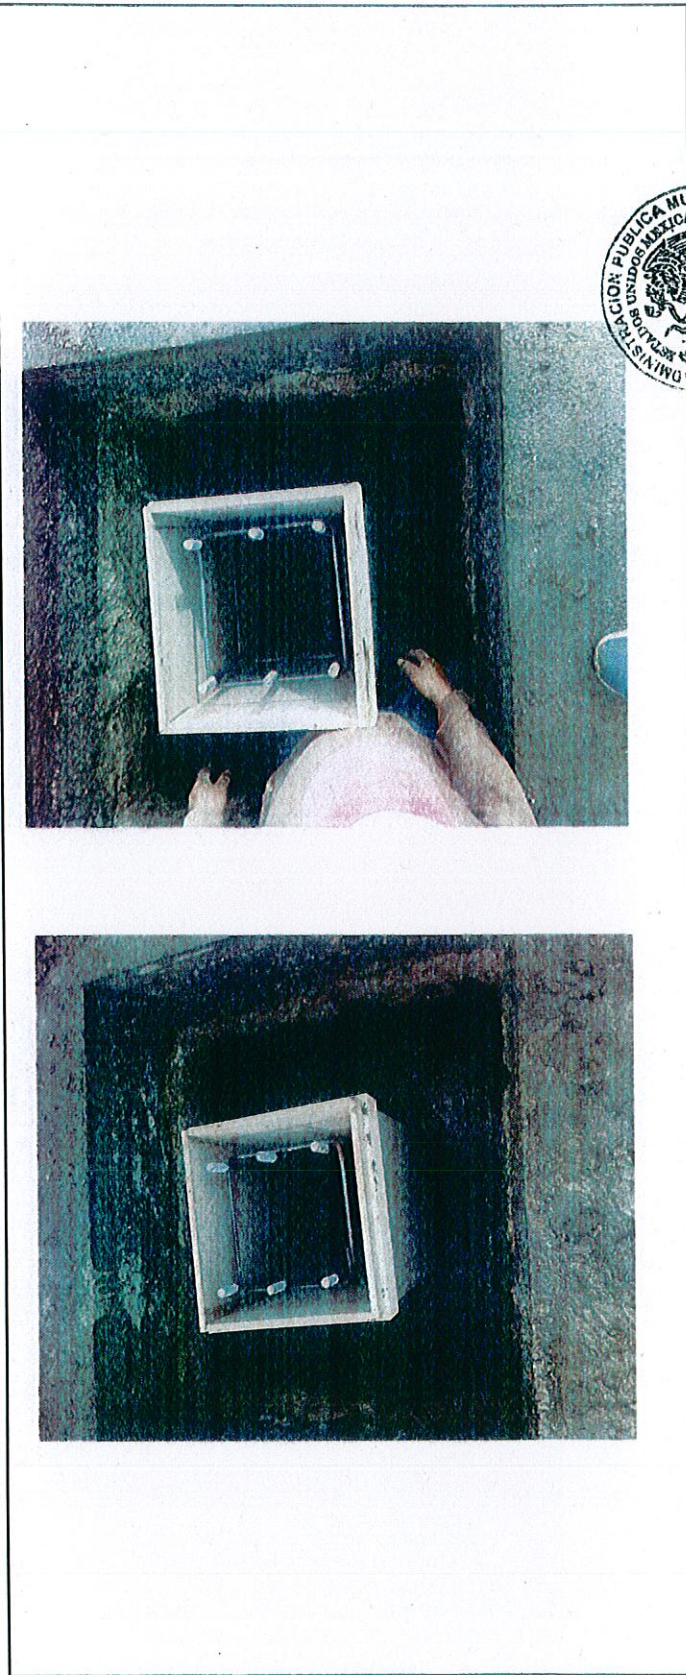






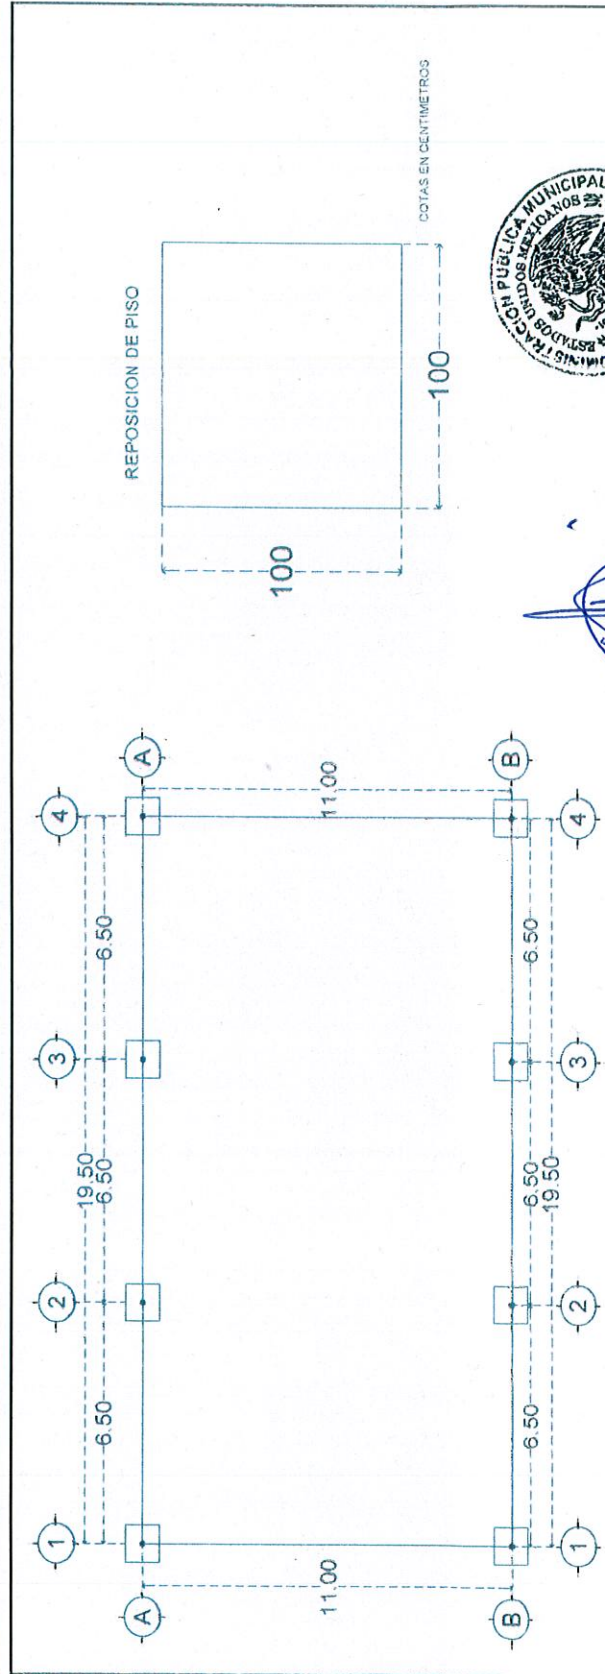
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REPRESENTANTE LEGAL: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA: ING. JOSE DAVID DAMIAN RIOS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		CONTRATO No. DOP/FFIB/2018-09/020		OBSERVACIONES				
OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT UBICACION: CIUDAD GUZMAN, JALISCO. CONTRATISTA: ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO		ESTIMACION No. 1 (ONO) HOJA No. 4 DE 4 PERIODO: DEL 07 AL 17 DE OCTUBRE DE 2018						
NUMEROS GENERADORES DE OBRA								
No.	CONCEPTO	REFERENCIA	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	TOTAL	U
304-ALE-06-014	REPOSICIÓN DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO FC= 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	A , '1-4 B , '1-4	1.00 1.00	1.00 1.00		4.00 4.00	4.00 4.00	M2 M2
					TOTAL:		8.00	M2
REPRESENTANTE LEGAL  ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO		JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA  ING. JOSE DANIEL GAMIAN RIOS				 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO No.	DOP/FFIB/2018-09/020
	OBRA:	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT
304-ALB-06-014	UBICACION:	CIUDAD GUZMAN, JALISCO.
	CONTRATISTA:	ING. SIAMIR YOSOR CARDENAS DEL TORO
CROQUIS		
REPOSICIÓN DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO FC- 150 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.		





REPRESENTANTE LEGAL
 ING. SIAMIR YOSOR CARDENAS DEL TORO

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA
 ING. JOSE DAVID SAMIAN RIOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DE ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO No. DOP/FFIB/2018-09/020	ESTIMACION No. 1 (UNO)
	OBRA: CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS HENRY DURANT	HOJA No. 4 DE 4
UBICACION: CIUDAD GUZMAN, JALISCO	ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO	PERIODO: DEL 17 AL 17 DE OCTUBRE DE 2018
CONTRATISTA:		REALIZO:
REPORTE FOTOGRAFICO		
304-ALB-06-014	REPOSICIÓN DE PISO DE 6 CM ACABADO ESCOBILLADO, DE CONCRETO FC= 150 KG/CM ² , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA

ING. JOSE MANUEL RAMAN RIOS

REPRESENTANTE LEGAL

ING. SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO
